


現場定点観測(中央通りからの全景)




今月の工事はこんな感じで進んでいます！

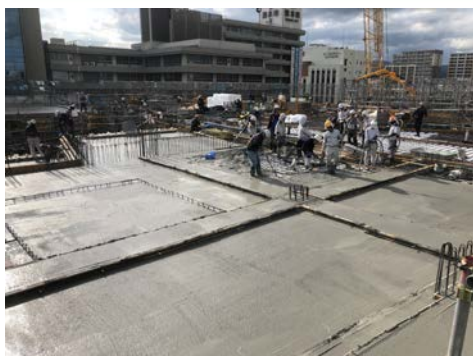

3階の床を作っています。



丸柱を建て、床を作るための足場を組みます。

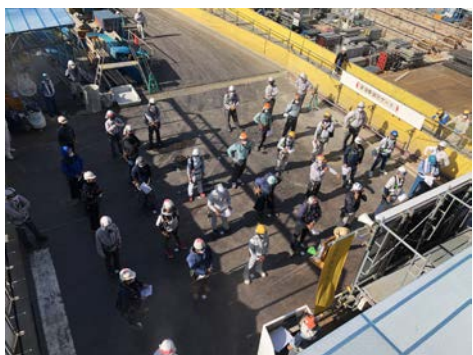

コロナ対策で朝礼は、間隔を空けて少人数で実施。



完成イメージ



夏本番！！
熱中症予防の対策をして、
安全に作業を進めています！

現場での取り組み—vol.08



外部ネットはなぜ2色なん？

建物の外周には作業用の足場を組んでいます。ネットがブルーの位置に階段が付いています。誰でも分かりやすく。



茨フェスでおにクルの展示開催！

福祉文化会館の展示スペースでおにクルの施設紹介や建物に組み込まれる免震装置の実験動画。「おにクル」のVR体験でたくさんの方におにクルの魅力をお伝えできたと思います。

- 7月の工程 -

- ・2～3階立上り躯体工事
- ・外部足場組立
- ・地上梁サイトPC製作

- 8月の工程 -

- ・2～3階立上り躯体工事
- ・鉄骨組立
- ・外部足場組立
- ・地上梁サイトPC製作
